



INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

AKTUELLE THEMEN DER GEMEINDE

1. TOP THEMEN DER GEMEINDE KRAUSCHWITZ

- 1.1. MEHRZWECKGEBÄUDE KRAUSCHWITZ
- 1.2. SACHSTAND JUNGENDTREFF
- 1.3. MITTEL STÄRKUNG LÄNDLICHEN RAUM BEZOGEN AUF DAS BUDGET
ORTSCHAFTSRAT
- 1.4. SANIERUNG OS KRAUSCHWITZ
- 1.5. SACHSTAND SANIERUNG ORTSSTRASSEN/ ODER- NEIßERADWEGES
- 1.6. SACHSTAND ERLEBNISWELT KRAUSCHWITZ
- 1.7. GERÄTEHAUS SKERBERSDORF
- 1.8. LED-UMSTELLUNG
- 1.9. PV-ANLAGE SAGAR
- 1.10. OU KRAUSCHWITZ

2. TERMINE

3. SONSTIGES



**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

1.1. Investitionsvorhaben



Heute

1.1 Mehrzweckgebäude

1.2. Jugendtreff Keula

1.3. Mittel Stärkung ländlicher Raum

1.4. Sanierung Oberschule

1.5. Sanierung Ortsstraßen

1.7. Neubau FF-Gerätehaus Skerbersdorf

1.1. Mehrzweckgebäude im Ortszentrum Leuchtturmprojekt

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

SACHSTAND:

ABSTIMMUNGEN ZWISCHEN NUTZER PLANER IST ERFOLGT.

- ENTWURFSPLANUNG + RAUMKONZEPT IST ZUR ZEIT IN ERSTELLUNG. GEPLANTE ABGABE KW 40
- ABSTIMMUNG ZWISCHEN PLANERN UND BAUHERREN FÜR ABRUCH DEUTSCHES HAUS ERFOLGT DERZEIT.
- **BETEILIGUNG ZWISCHEN NUTZER/FACHPLANER ZUM ERSTEN ENTWURF IST ERFOLGT.
ÄNDERUNGSWÜNSCHE WERDEN DERZEIT EINGEARBEITET**

➤ **1.TERMIN MIT BAUAUFSICHT/FACHPLANER IST ERFOLGT.**

➤ **NÄCHSTE SCHRITTE:**

- 1. Beteiligung Fachplaner / Nutzer
- 2. Vorstellung Gemeinderat
- 3. Abstimmung Bauaufsichtsbehörden

-> FÖ-ANTRAG ANFANG 1 QUARTAL 2023 GEPLANT

GESAMTKOSTEN FÜR DAS PROJEKT:

GESAMTKOSTEN: 6.040.000 €

EIGENANTEIL: 342.736 €

FÖ-SUMME: 5.697.264 €

1.2. Errichtung eines Jugendtreffs in Krauschwitz / Haus der Demokratie

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

SACHSTAND:

- ÜBERNAHME OBJEKT SIEHE HEUTIGE SITZUNG
- VORSTELLUNG DES PROJEKTES IM BEGLEITAUSSCHUSS IST AM 16.09.2022 IN KAMENZ ERFOLGT
- **VORABSTIMMUNG MIT PLANERN DERZEIT IST BEI EINEM VOR ORTTERMIN ERFOLGT**
- **ÜBERNAHME (NOTARTERMIN IN ABSTIMMUNG)**
- **NÄCHSTE SCHRITTE:**
 - 1. Votum des 4 regionalen Begleitausschuss
 - 2. Ausschreibung Planer / Fachplaner
 - 3. Einreichung Bauantrag + FÖ-Antrag

-> FÖ-ANTRAG ANFANG 2 QUARTAL 2023 GEPLANT

GESAMTKOSTEN FÜR DAS PROJEKT:

GESAMTKOSTEN: 1.600.000 €

EIGENANTEIL: 80.000 €

FÖ-SUMME: 1.520.000 €

€

1.3. Budget Ortschaftsrat FÖ-Antrag Leader

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

SACHSTAND:

ABSTIMMUNG ARBEITEN VEREINE IST ERFOLGT

KOSTENANGEBOT FÜR DIE SANIERUNG IST EINGEGANGEN (MATERIAL)

BAUBEGINN AN ZWEI BUSHALTESTELLEN IST ERFOLGT (1 PECHERN / 2. WERDECK)

VERLÄNGERUNG BIS 31.12.2023 WIRD BEANTRAGT

AUFTRAG FÜR SCHUTZHÜTTEN WURDE ERTEILT.

STANDORTE WERDEN DURCH DEN ORTSCHAFTSRAT BEKANNTGEGEBEN


MATERIALBESTELLUNG IST AUSGELÖST. BAUBEGINN AUGUST 2022

DETAILS:

FÖRDERSUMME : CA. 35 T€

EIGENANTEIL: CA. 0 T€* PREISGELD 10T€

1.3. Projekt Ortschaftsrat

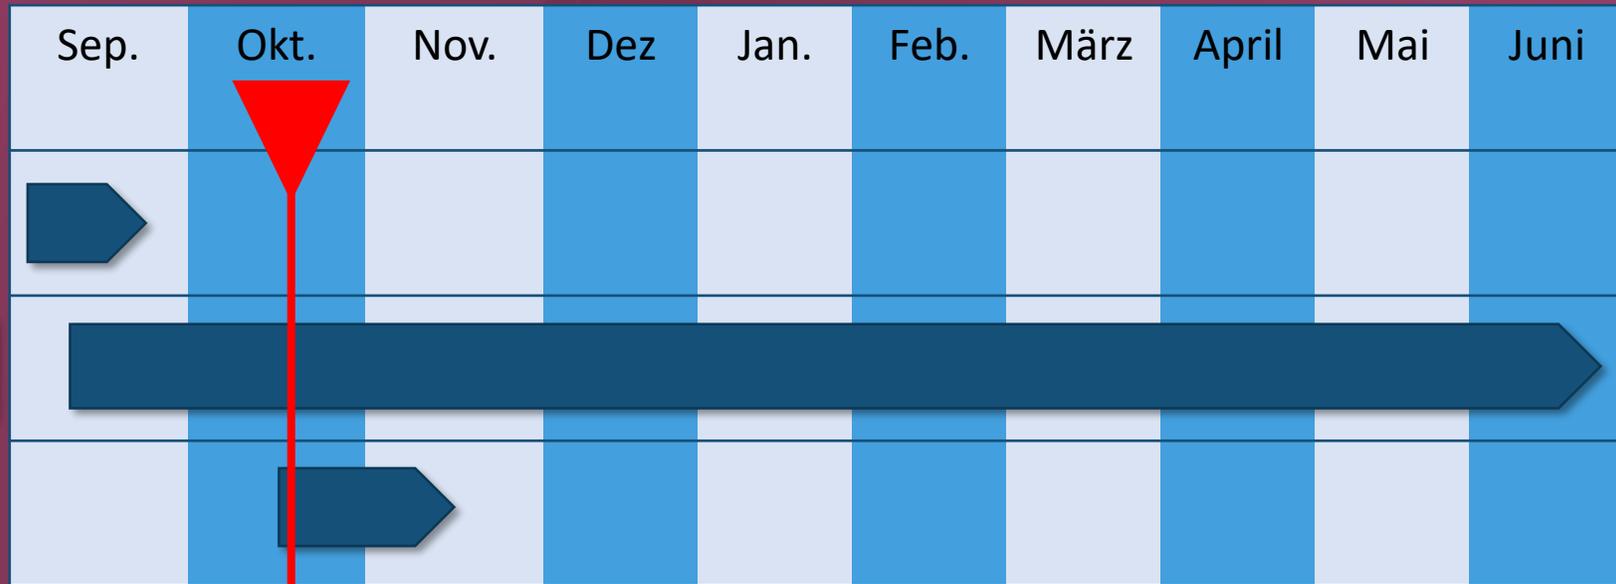

Abstimmung Vereine

Beginn Bau- und Umsetzungsphase

Verlängerung Fö-Bescheid

Heute

1.4. Sanierung Oberschule 1 Tranche




SACHSTAND:

- KSP-ANTRAGE FÜR DIE 1. TRANCHE DES 3 BA IST GESTELLT
- DERZEIT PRÜFUNG DURCH DIE SAB
- **INFORMATION SAB: ANTRAG WURDE ZUR BEWILLIGUNG AN DAS SMR ÜBERMITTELT.**
- **NÄCHSTE SCHRITTE:**
 - 1. Erhalt des Änderungsbescheides in der Stadt Bad Muskau
 - 2. Beginn Ausführungsplaung Jan. 2023
 - 3. eventueler Baustart Anfang 3 Quartal 2023
- nicht Förderfähige Kosten 971.809,30 € können über andere Fördermöglichkeiten teilweise kompensiert werden.

Gesamtkosten	5.849.193,00 €	
Förderfähig	4.877.383,70 €	
	Variante 1	Variante 2
Fö-Summe	4.389.645,33 €	3.251.588,81 €
Eigenanteil	1.459.547,77 €	2.597.604,19 €
% Förderung	75	56

1.4. Projekt 3 BA 1. Tranche

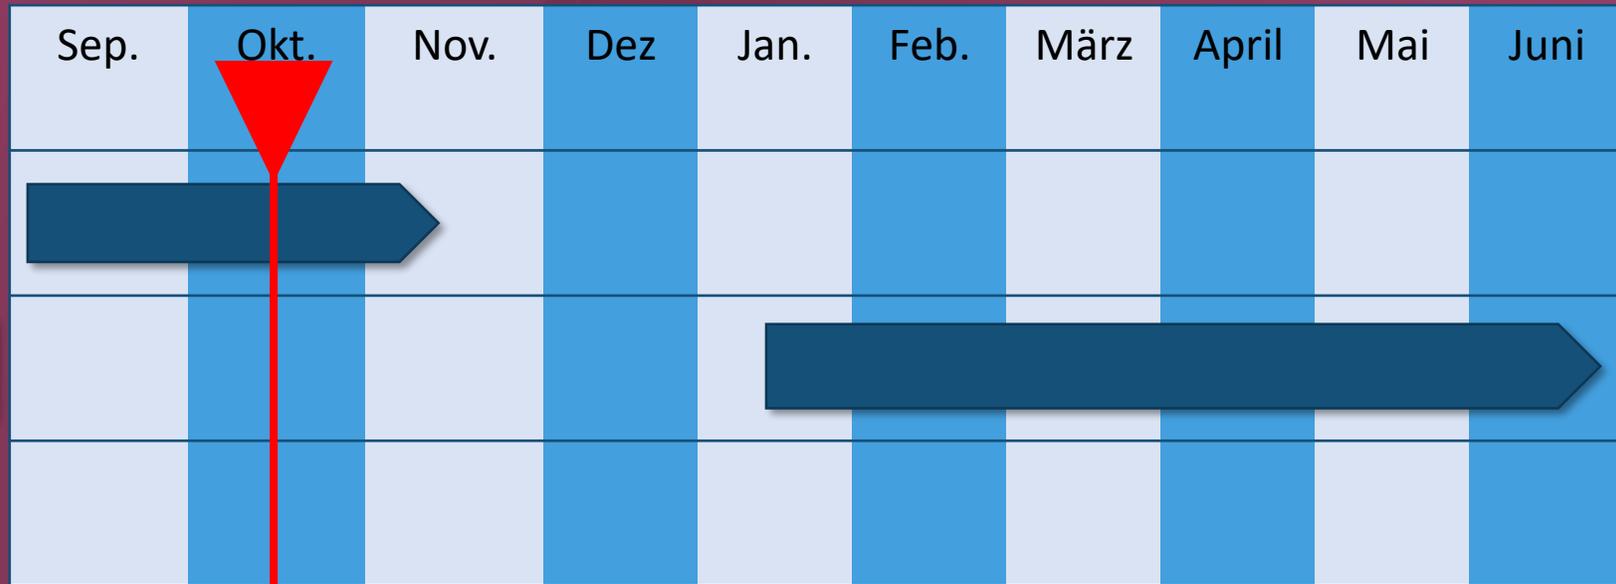

Abstimmung Behörden / SAB

Ausführungsplanung

Baubeginn

Heute

1.5. Sachstand Sanierung Ortsstraßen/ Oder- Neißeradweges

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

PROJEKT SANIERUNG RADWANDERWEG

- TEILPROJEKT 1 (TEILSTÜCK 1) -> SAGAR /SKERBERSDORF
- MAßNAHME FÜR DIE SANIERUNG IST ABGESCHLOSSEN.

➤ **BAUMPFLANZUNG NOCH OFFEN -> VERGABE SIEHE HEUTIGE SITZUNG**

➤ **BUDGETPLANUNG -> KEINE KOSTENSTEIGERUNG**

TEILPROJEKT 2 (TEILSTÜCK 2) -> SKERBERSDORF / WERDECK

VERGABE UND BAUANLAUFBESPRECHUNG IST ERFOLGT.

BAUBEGINN 01.11.2022

KEINE KOSTENSTEIGERUNG ERSICHTLICH

TEILPROJEKT 3 (TEILSTÜCK 3) -> WERDECK / GEMARKUNGSGRENZE

FÖRDERMITTELANTRAG IN ARBEIT

ORTSSTRASSEN

PROJEKTE 2021

LANGE STRAÙE -> ABNAHME IST ERFOLGT / DERZEIT ERFOLGEN VERHANDLUNGEN MIT DER FIRMA ZU DEN ENTSTANDENEN MEHRKOSTEN

TÖPFERWEG -> BAUVERZUG UMSETZUNG DES TEILSTÜCKS IST FÜR DIESES JAHR GEPLANT

PROJEKTE 2022

SANIERUNG ORTSSTRASSEN IN DEN ORTSTEILEN-> AUFTRAG IST AN FIRMA NADEBOR ERFOLGT.

PROJEKT KLEIN PRIEBUS (KREUZUNGSBEREICH / REGENRINNEN) IST ABGESCHLOSSEN.

Kosten:

1. BA: FÖ-Mittel: 275T€ Eigenmittel:31T€ gesamt: 306T€

2. BA: FÖ-Mittel: 293T€ Eigenmittel:32T€ gesamt: 325T€

1.5. Sachstand Sanierung Ortsstraßen/ Oder- Neißeradweges



1.6. Sachstand Erlebniswelt Krauschwitz

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

SACHSTAND:

**KARTENVORVERKAUF FÜR DIE SILVESTERVERANSTALTUNG HAT BEGONNEN
– GUTE VORRESERVIERUNG**

BESUCHER (STAND 02.10.2022): BAD 36.022 / SAUNA: 13.447

UMSATZERLÖSE AUF DEN STAND VON 2019.

1.7. Feuerwehr-Gerätehaus Skerbersdorf

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

SACHSTAND:


- AUSFÜHRUNGSPLANUNG WURDEN ERTEILT
- ABRISSARBEITEN SIND ABGESCHLOSSEN UND WAREN IM GEPLANTEN BUDGET
- AUSFÜHRUNGSPLANUNG WIRD DERZEIT DURCH ARCHITEKTEN UND FACHPLANERN ERSTELLT.
- AUSSCHREIBUNG UND VERGABE BAUHAUPTGEWERK IST ERFOLGT
- AUSSCHREIBUNG WEITERER BAULOSE IST FÜR DAS 3 QUARTAL 2022 GEPLANT.
- **BAUANLAUFBERATUNG MIT FA. NEUMANN WURDE DURCHGEFÜHRT, BAUBEGINN (ERDARBEITEN INNERHALB DIESER WOCHE)**

BAUKOSTEN:

GESAMTKOSTEN: CA. 1 MIO. €

EIGENANTEIL: CA. 600.000 €

1.7. Feuerwehr-Gerätehaus Skerbersdorf

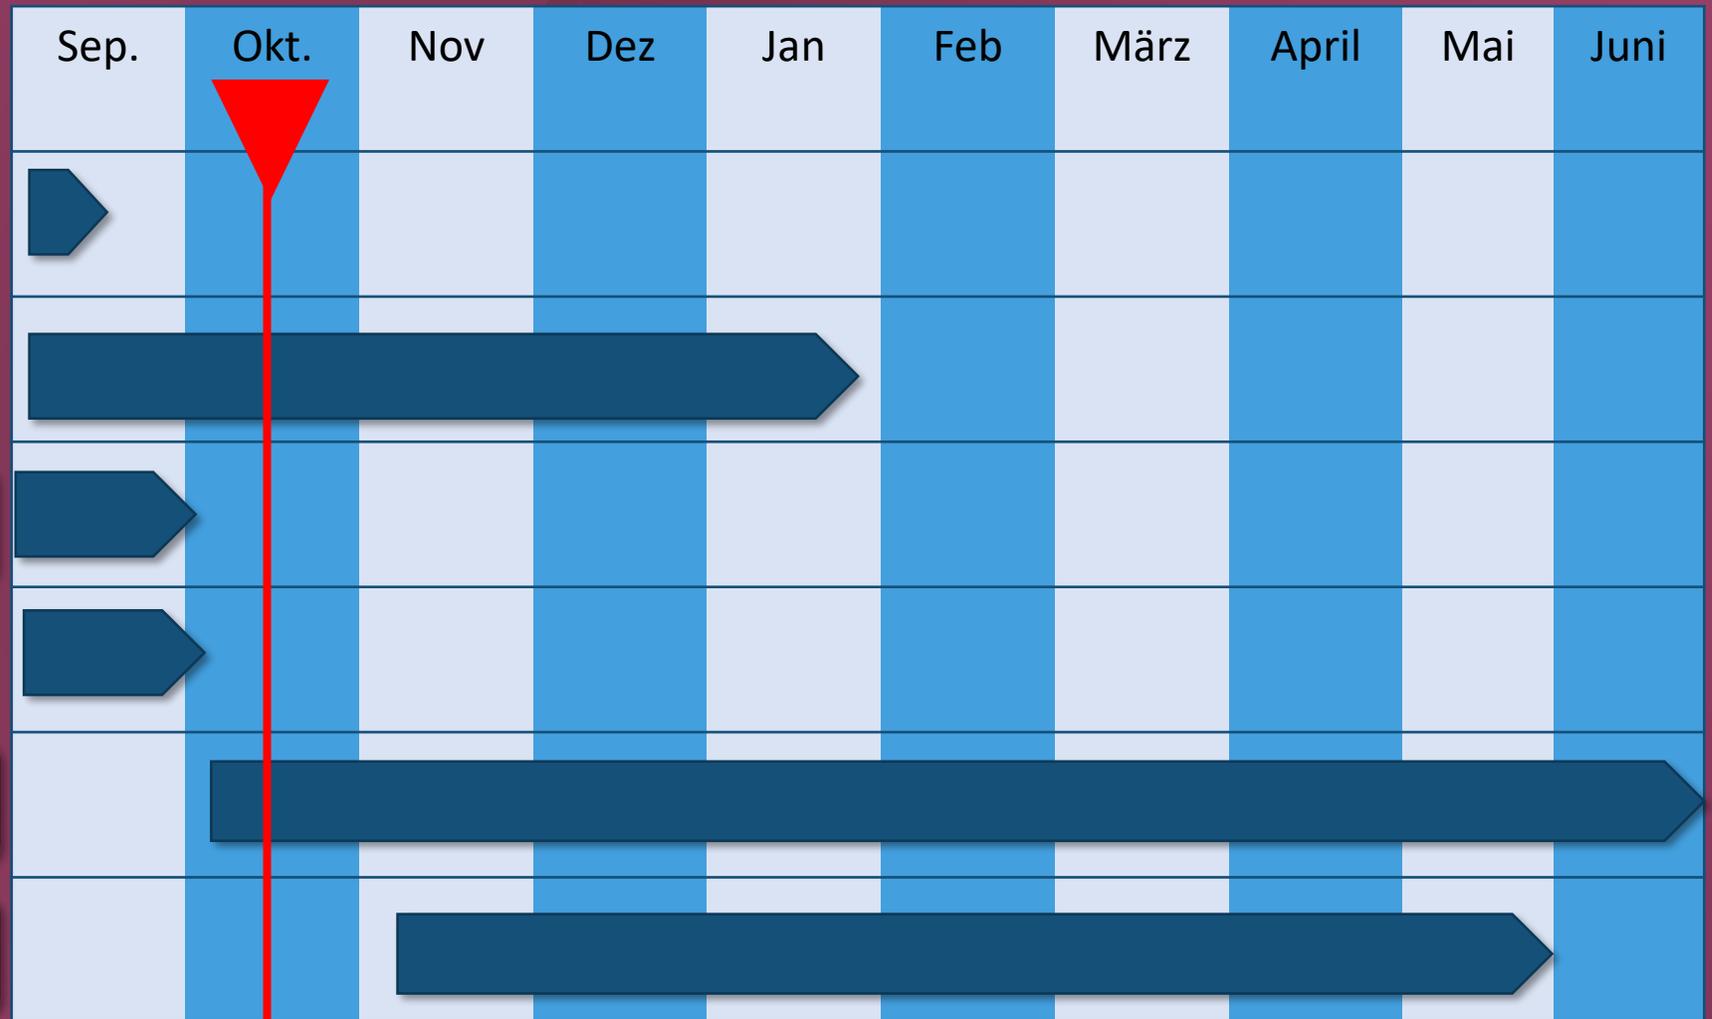

Heute

Abrissarbeiten

Ausführungsplanung

Ausschreibung
Bauhauptgewerke

Vergabe Bauhauptwerk

Baubeginn

Ausschreibung Gewerke

1.8. LED Umstellung

SACHSTAND:

- > ZUR ZEIT ERFOLGEN WEITERE PRÜFUNGEN ZU MÖGLICHEN FÖRDERMITTELN
- > NEUBERECHNUNG DER MÖGLICHEN FÖRDERMITTEL SOWIE DES EIGENMITTEL INFORMATIONEN IN DEN VWA
- > VORAUSSICHTLICHER PROJEKTSTART 2023

DETAILS:

GESAMTSUMME: 500 T€

FÖRDERSUMME: 475 T€

EIGENMITTEL: 25 T€




**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

1.9. PV-anlage Sagar

**Gemeinde
Krauschwitz
d. O.L.**

SACHSTAND:


- FINANZIELLE BETEILIGUNG DER KOMMUNE ÜBER §6 EEG*
- EINMALIGE ZAHLUNG FÜR DIE ERRICHTUNG VON INFRASTRUKTUR AUF GRUNDSTÜCKEN DER KOMMUNE
- AUSLEGUNG IST ERFOLGT.
AUFARBEITUNG DER STELLUNGNAHMEN
DURCH DIE UKA

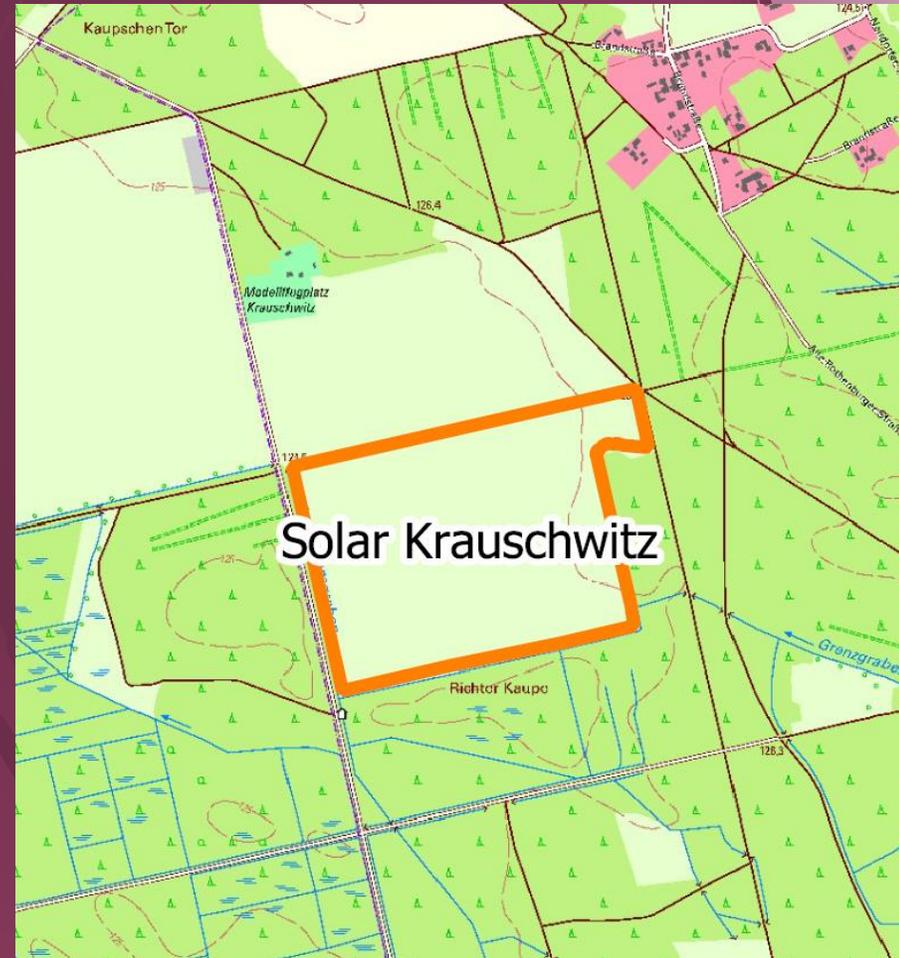

1.9. PV-anlage Sagar



ZEITPLAN:

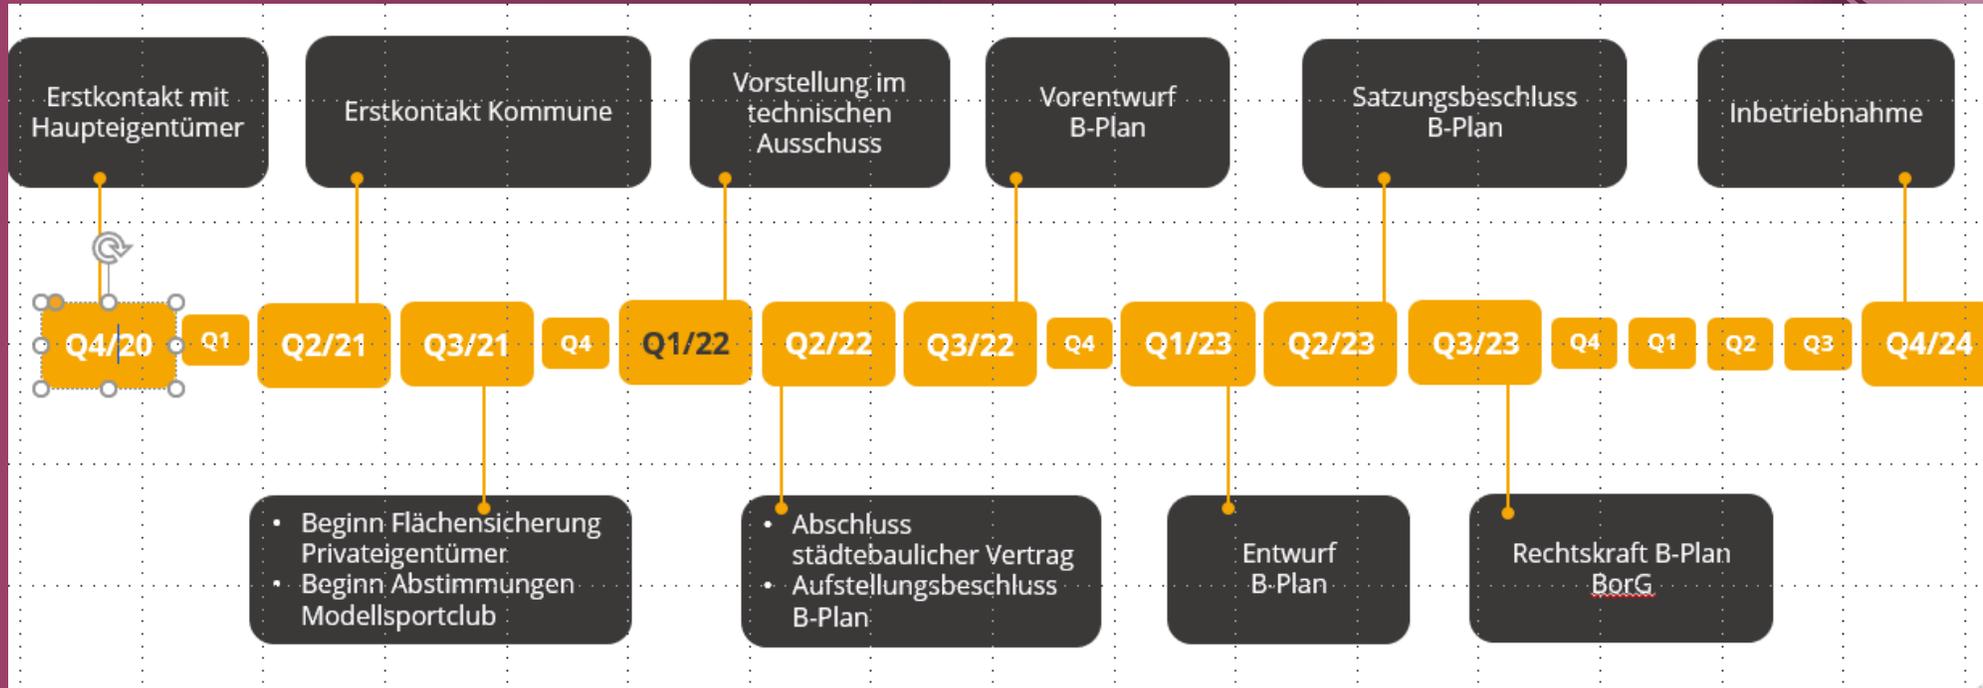


1.10. OU Krauschwitz

**Gemeinde
Krauschwitz
O.L.**

SACHSTAND:

- TERMIN ZUM AKTUELLEM SACHSTAND ZWISCHEN VERWALTUNG / LASUV UND TA HAT IM FEBRUAR STATTFUNDEN
- VORSTELLUNG DER VORZUGSVARIANT IM 3 QUARTAL 2022 GEPLANT
- TERMIN ZWISCHEN TECHNISCHEN AUSSCHUSS UND LASUV HATTE IM OKTOBER STATTFUNDEN.
- DERZEIT ERFOLGT EINE ENTWURFPLANUNG, WELCHE IM 1. QUARTAL VORGESTELLT WERDEN SOLL.

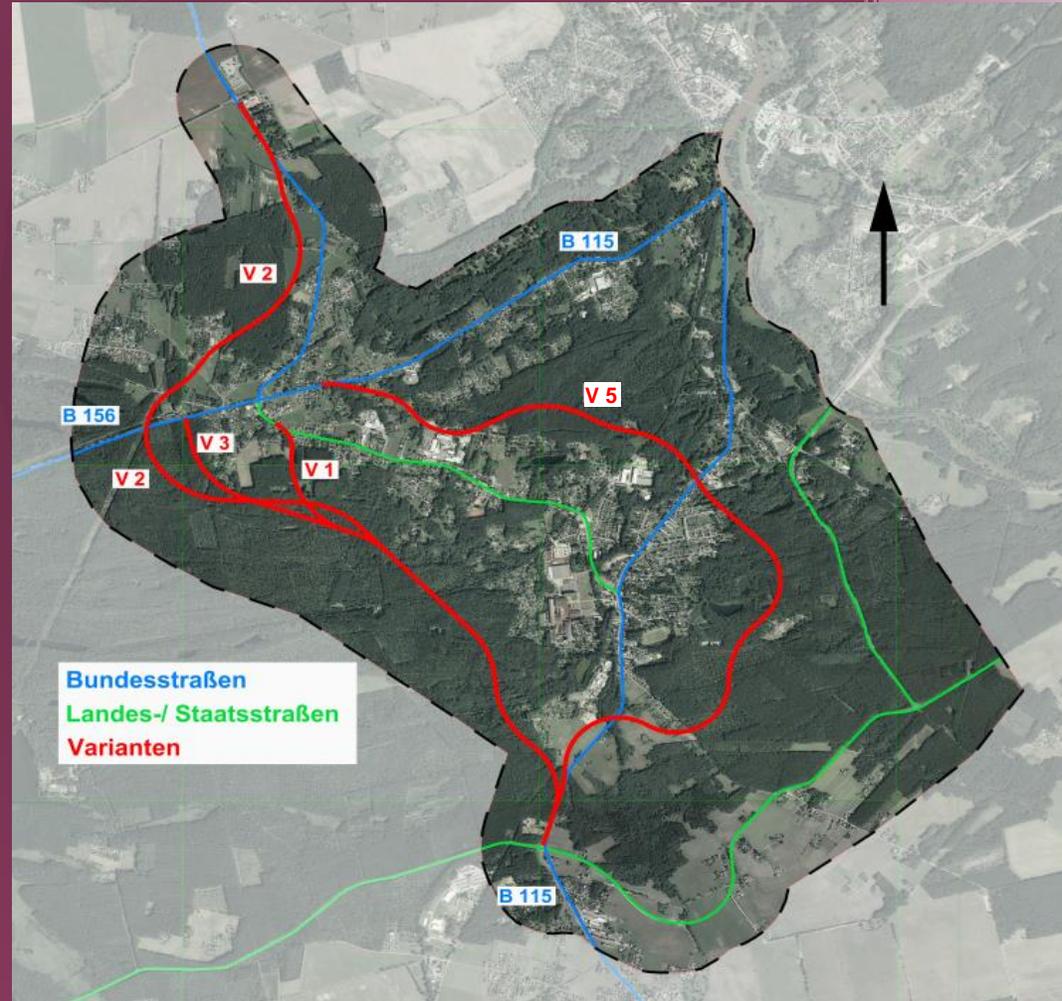

2. TERMINE

ORTSCHAFTSRATSSITZUNG PECHERN

26.10.2022

BEGINN: 18:00 UHR

TECHNISCHER-AUSSCHUSS:

07.11.2022

BEGINN: 17:00 UHR

VERWALTUNGS-AUSSCHUSS

08.11..2022


BEGINN: 17:00 UHR

GEMEINDERATSSITZUNG :

22.11..2022

BEGINN: 18:00 UHR

Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden ortsüblich bekanntgegeben



VIELEN DANK

Ihr Bürgermeister

