Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.

INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS

AKTUELLE THEMEN DER GEMEINDE

1. TOP THEMEN DER GEMEINDE KRAUSCHWITZ

1.1. MEHRZWECKGEBÄUDE KRAUSCHWITZ

1.2. SACHSTAND JUNGENDTREFF (HÜTTENBAUDE)

1.3. MITTEL STÄRKUNG LÄNDLICHEN RAUM BEZOGEN AUF DAS BUDGET ORTSCHAFTSRAT

1.4. SANIERUNG OS KRAUSCHWITZ

1.5. SACHSTAND SANIERUNG ORTSSTRAßEN/ ODER- NEIßERADWEGES

1.6. SACHSTAND ERLEBNISWELT KRAUSCHWITZ

1.7. GERÄTEHAUS SKERBERSDORF

1.8. LED-UMSTELLUNG

1.9 PV-ANLAGE SAGAR

1.10 OU KRAUSCHWITZ

2. TERMINE

3. SONSTIGES

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

1.1. Investitionsvorhaben

1.1. Mehrzweckgebäude im Ortszentrum Leuchtturmprojekt

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

SACHSTAND:

- **DERZEIT: FÖ-ANTRAG IST AN DIE SAS ZUR PRÜFUNG ÜBERGEBEN WORDEN**
  - **BESCHEID ZUR EINREICHUNG DER FÖ-MITTEL SOLL BIS ZUM 21.04.2023 VORLIEGEN**
- **ABRISS: AUSSCHREIBUNG UND VERGABE VERGABE: SIEHE HEUTIGE SITZUNG**

NÄCHSTE SCHRITTE:

- Einreichung Förermittelantrag 04/2023
- Einreichung Bauantrag 05/2023

-> FÖ-ANTRAG MUSS BIS 31.03.2023 GESTELLT SEIN -> TEILZIEL ERREICHT

1.1. Mehrzweckgebäude im Ortszentrum

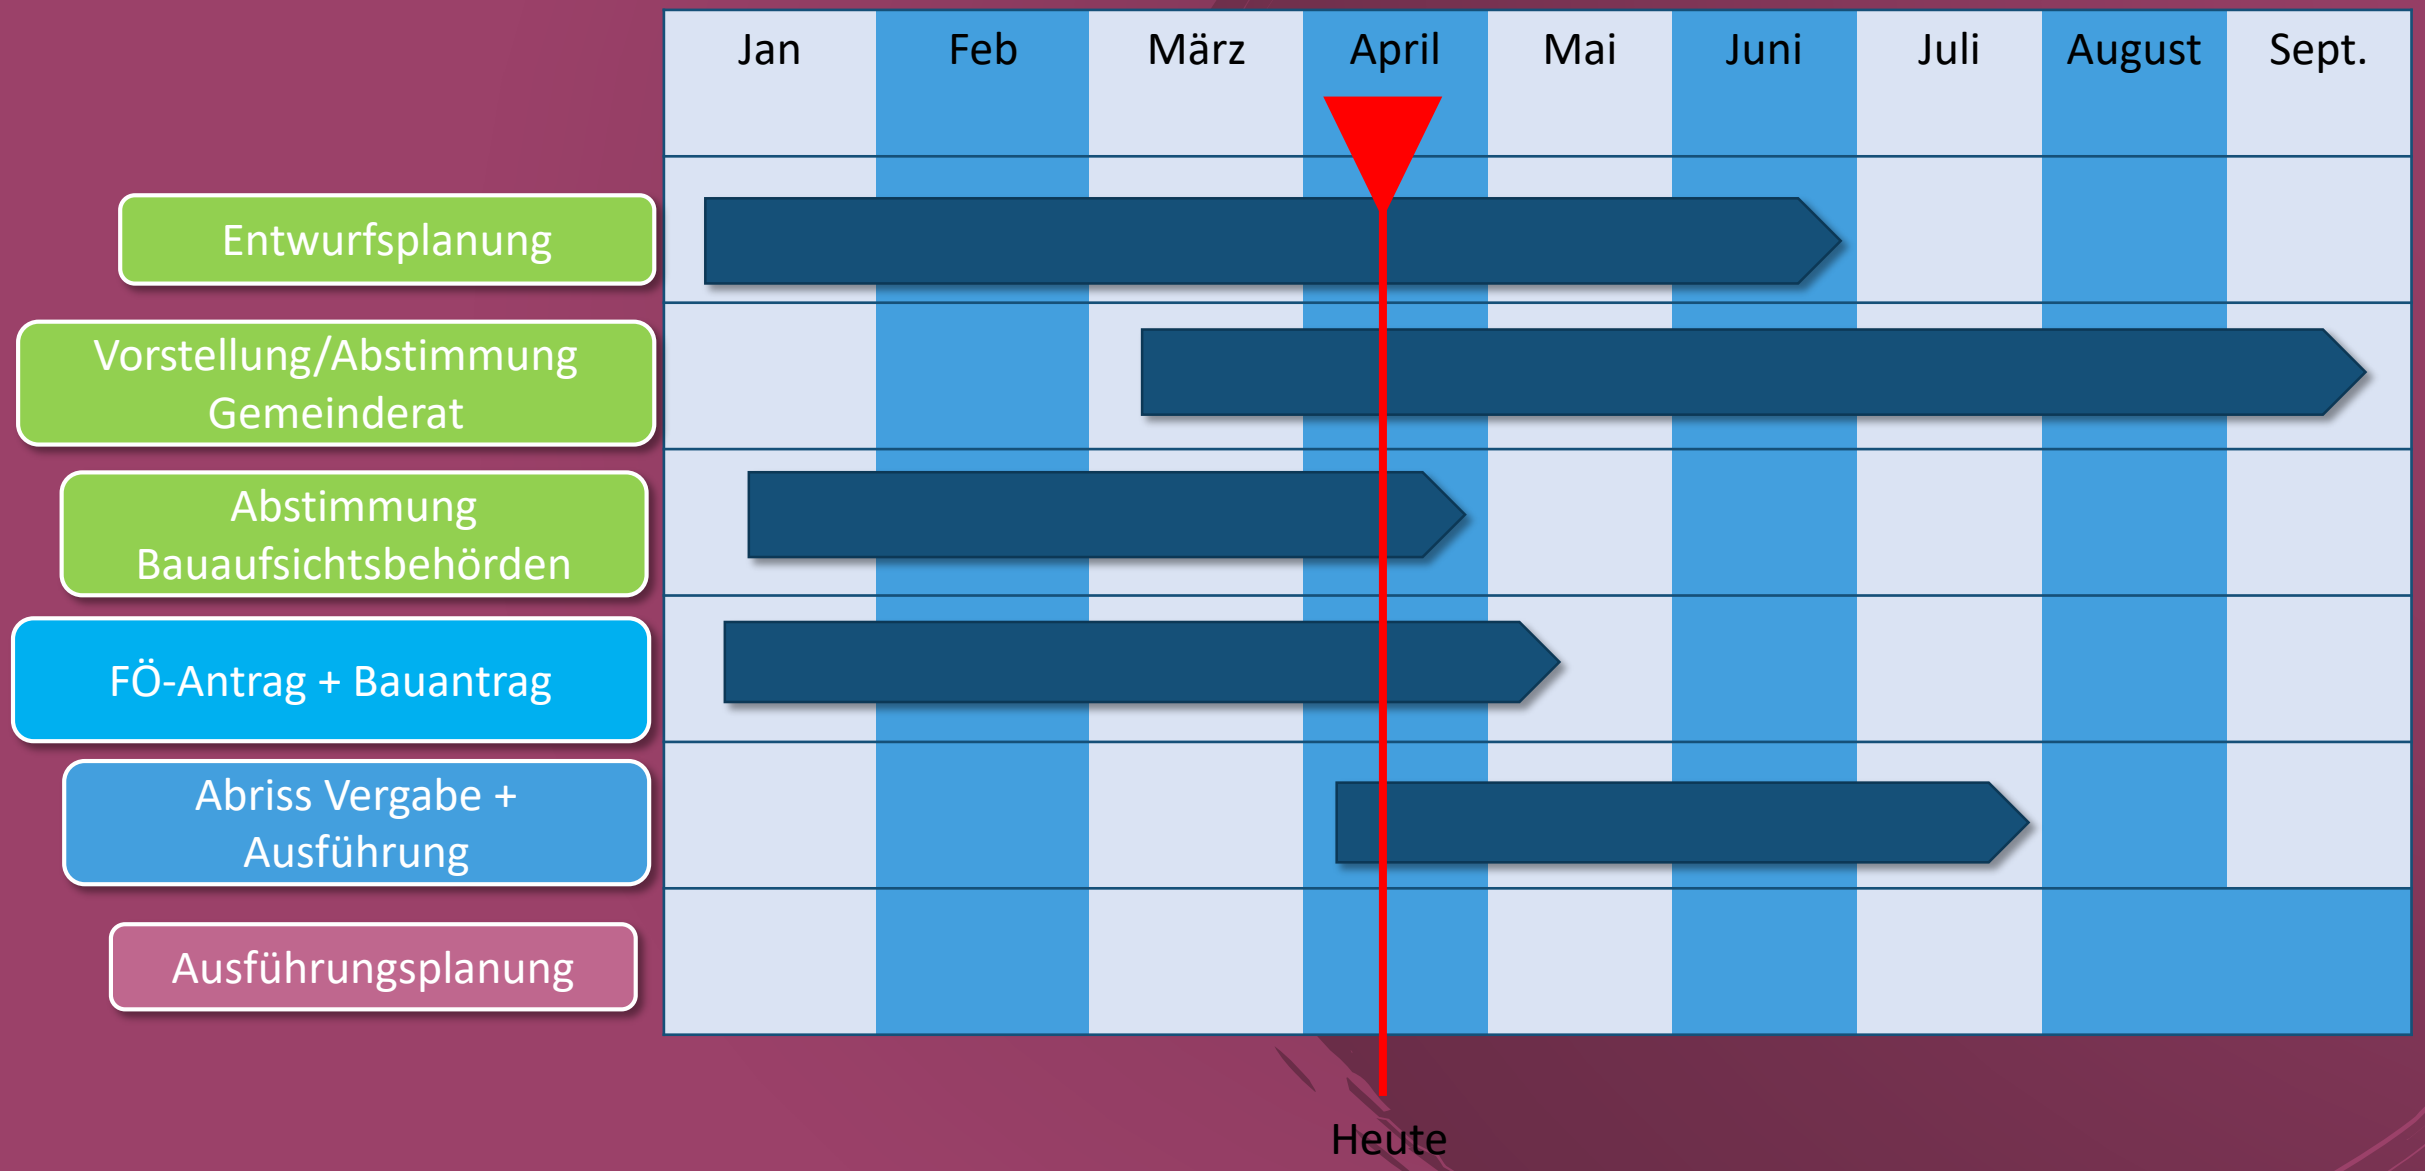

1.2. Hüttenbaude
Errichtung eines Jugendtreffs in Krauschwitz /

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

SACHSTAND:

- **GRUNDRISSSPLAUNG MIT NUTZERN ABGESTIMMT**
- **PLANUNGSÄNDERUNG AUF GRUND STATITSCHER PROBLEME IN DER TISCHTENNISHALLE**
  - **NEUE ENTWURFSPLANUNG ERFORDERLICH**

NÄCHSTE SCHRITTE:

- 1. Entwurfplaung bis mitte Mai Fertigstellung
- Vorstellung im Hauptausschuss 05/2023
- 3. Einreichung Bauantrag + FÖ-Antrag bis Juni 2023
- 4. FÖ-Antrag Anfang 2 Quartal 2023 geplant

GESAMTKOSTEN FÜR DAS PROJEKT:

GESAMTKOSTEN: 1.600.000 €

EIGENANTEIL: 80.000 €

FÖ-SUMME: 1.520.000 €

1.2. Errichtung eines Jugendtreffs in Krauschwitz / Haus der Demokratie

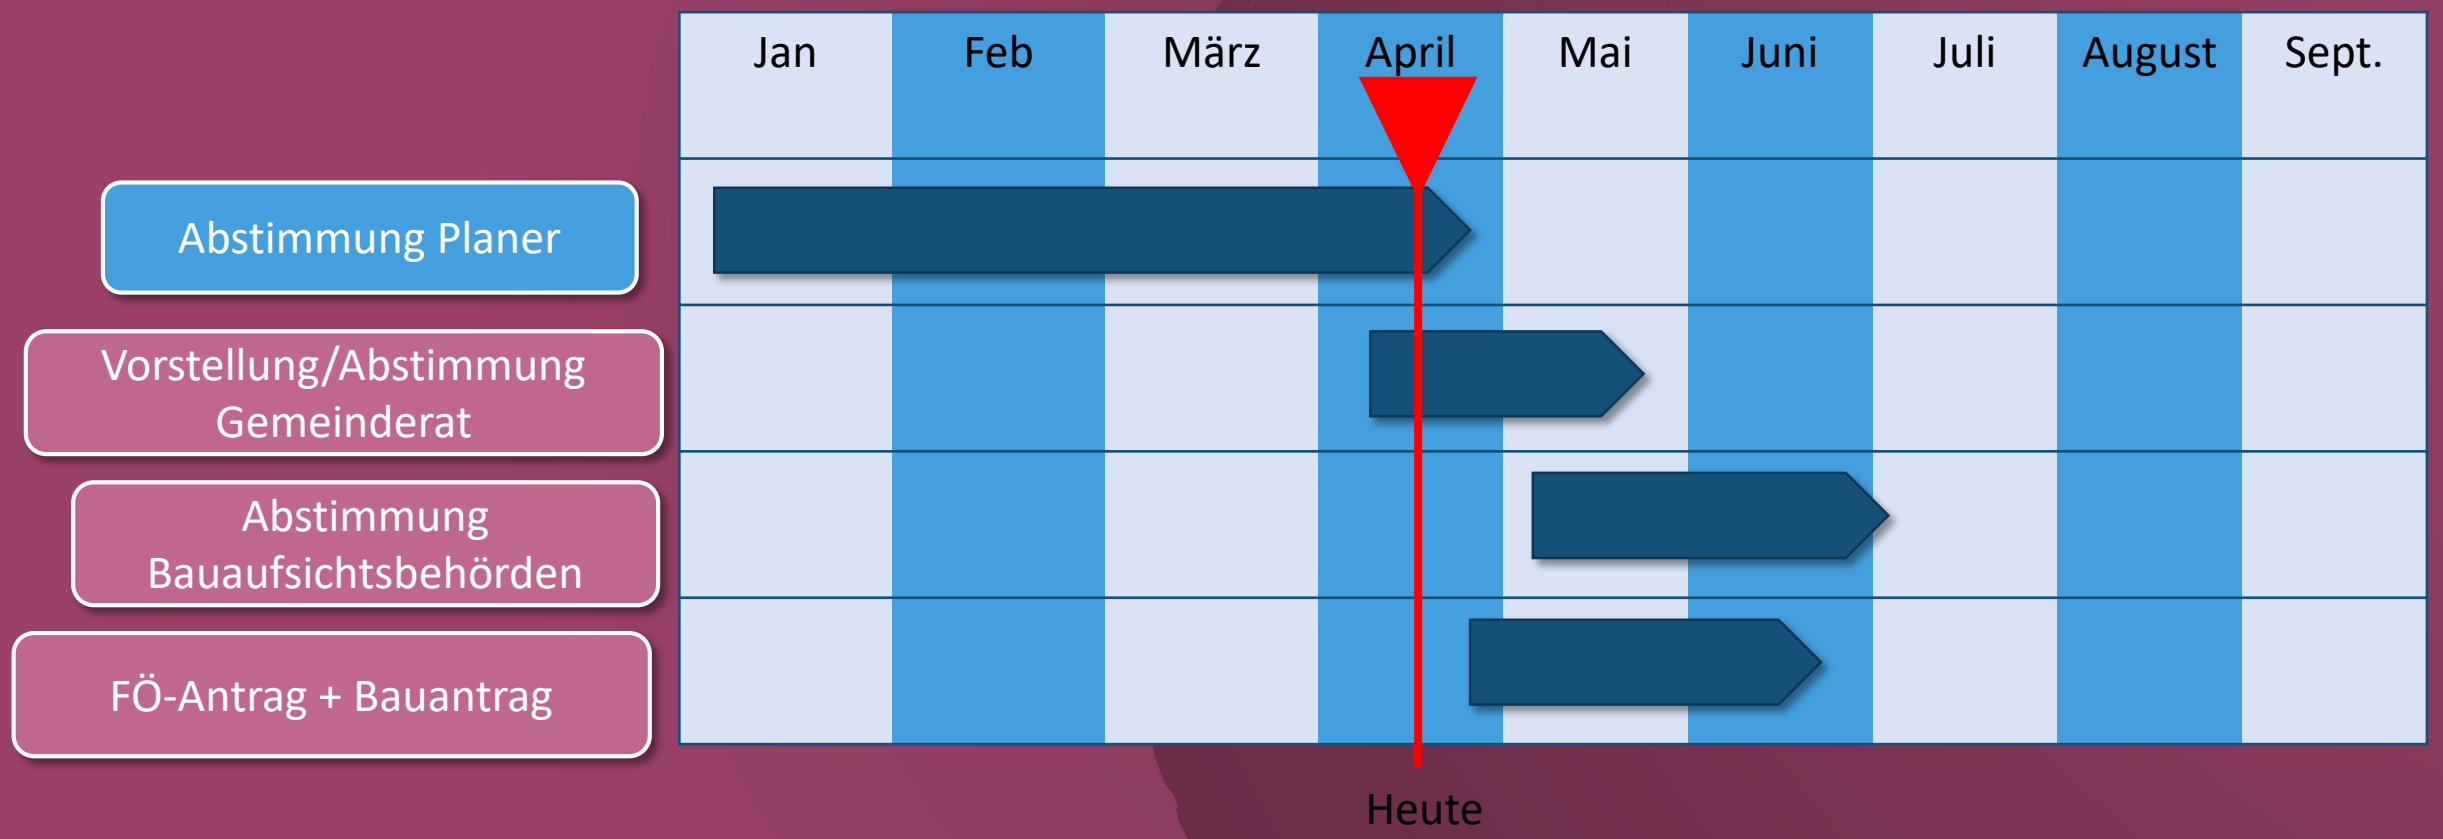

1.3. Budget Ortschaftsrat FÖ-Antrag Leader

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

SACHSTAND:

BAUBEGINN AN ZWEI BUSHALTESTELLEN IST ERFOLGT (1 PECHERN / 2. WERDECK)

VERLÄNGERUNG BIS 31.12.2023 WIRD BEANTRAGT IST ERFOLGT.

-> AUSSAGE FIRMA: MATERIAL IST VOR ORT, NACH WITTERUNGSVERBESSERUNG ERFOLGT DER AUFBAU VON 3 SCHUTZHÜTTEN.

ABRISS DER ALTEN HÜTTEN WURDE DURCH DEN BAUHOF ERLEIDGT.

STANDORTE **WURDEN** DURCH DEN ORTSCHAFTSRAT BEKANNTGEGEBEN

MATERIALBESTELLUNG IST AUSGELÖST. BAUBEGINN AUGUST 2022

DETAILS:

FÖRDERSUMME : CA. 35 T€

EIGENANTEIL: CA. 0 T€* PREISGELD 10T€

1.3. Projekt Ortschaftsrat

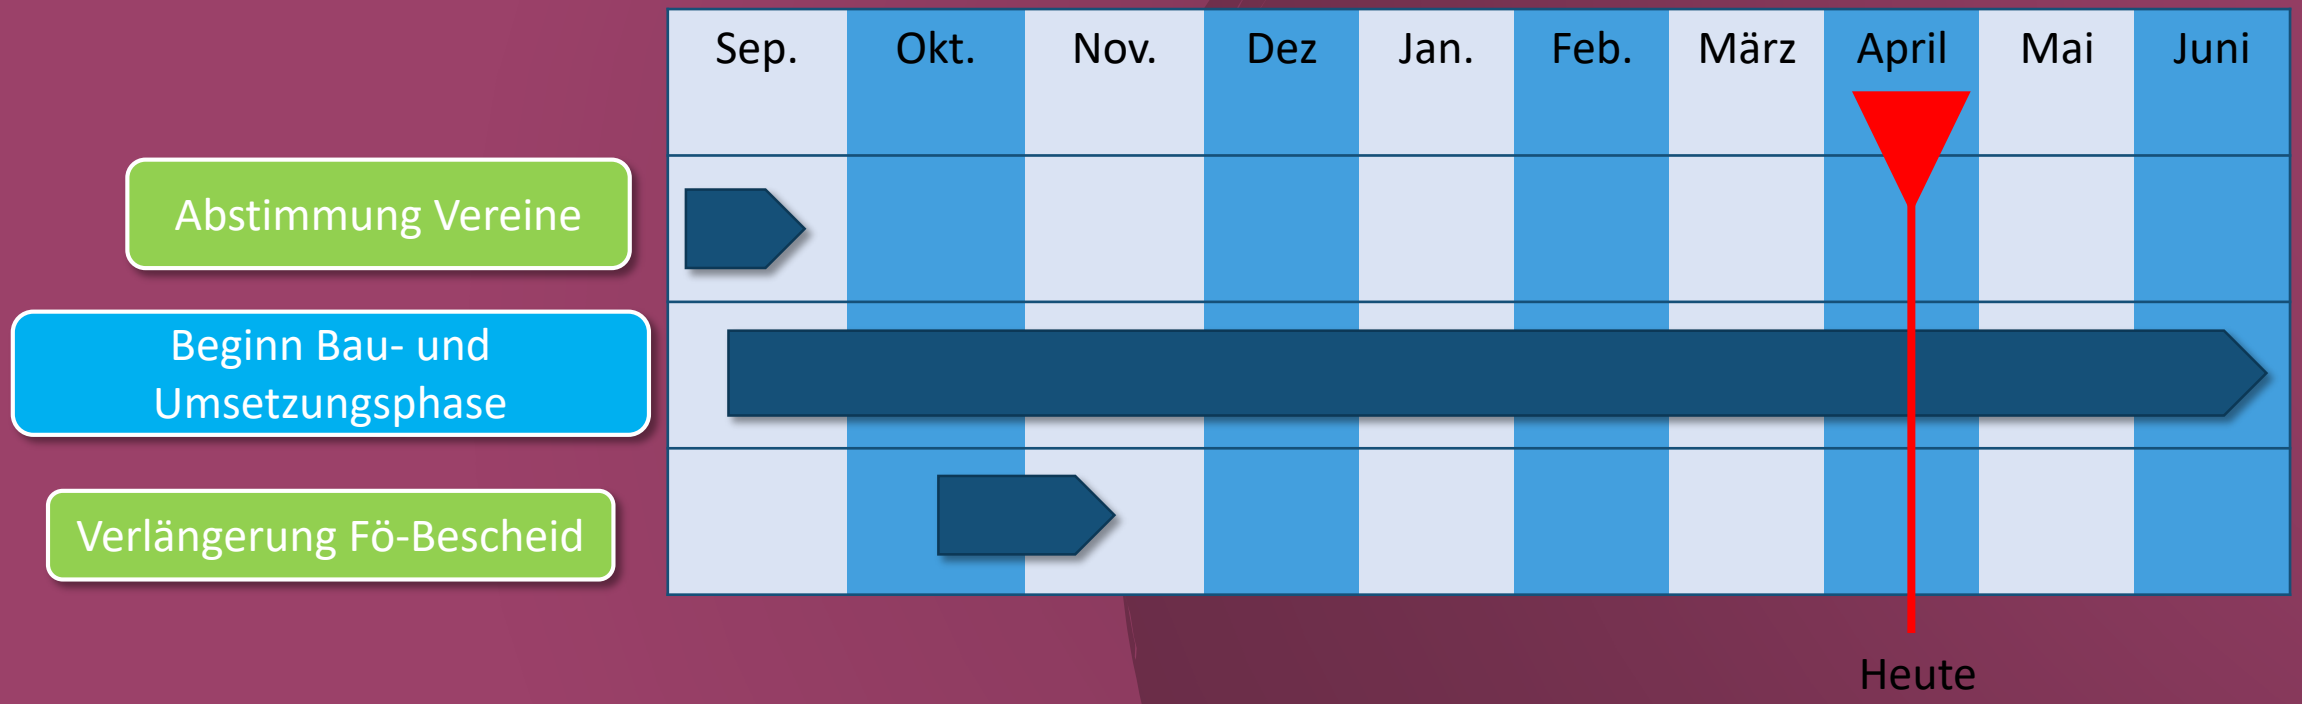

1.4. Sanierung Oberschule 1 Tranche

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

SACHSTAND:

- **FÖRDERMITTELANTRAG IN PRÜFUNG DURCH DIE SAB BESCHEID WIRD MIT MITTE AUGUST GERECHNET**
- **INFORMATION SAB: KSP-ANTRAG WURDE BEWILLIGT, EVIN-MITTEL FÜR 2022 WURDEN BEWILLIGT**
- **BEGINN DER AUSFÜHRUNGSPLAUNG DURCH PLANER**

NÄCHSTE SCHRITTE:

- 1. Erhalt des Änderungsbescheides in der Stadt Bad Muskau
- 2. Beginn Ausführungsplaung März. 2023
- 3. eventueller Baustart Anfang 3 Quartal 2023
- Laufende Abstimmung zwischen Fachplaner und KSP/Stadt Bad Muskau
- nicht Förderfähige Kosten 971.809,30 € können über andere Fördermöglichkeiten teilweise kompensiert werden.

GESAMTKOSTEN FÜR DAS PROJEKT (1 TRANCHE):

Gesamtkosten	5.849.193,00 €	
Förderfähig	4.877.383,70 €	
	Variante 1	Variante 2
Fö-Summe	**4.389.645,33 €**	3.251.588,81 €
Eigenanteil	**1.459.547,77 €**	2.597.604,19 €
% Förderung	**75**	56

1.4. Projekt 3 BA 1. Tranche

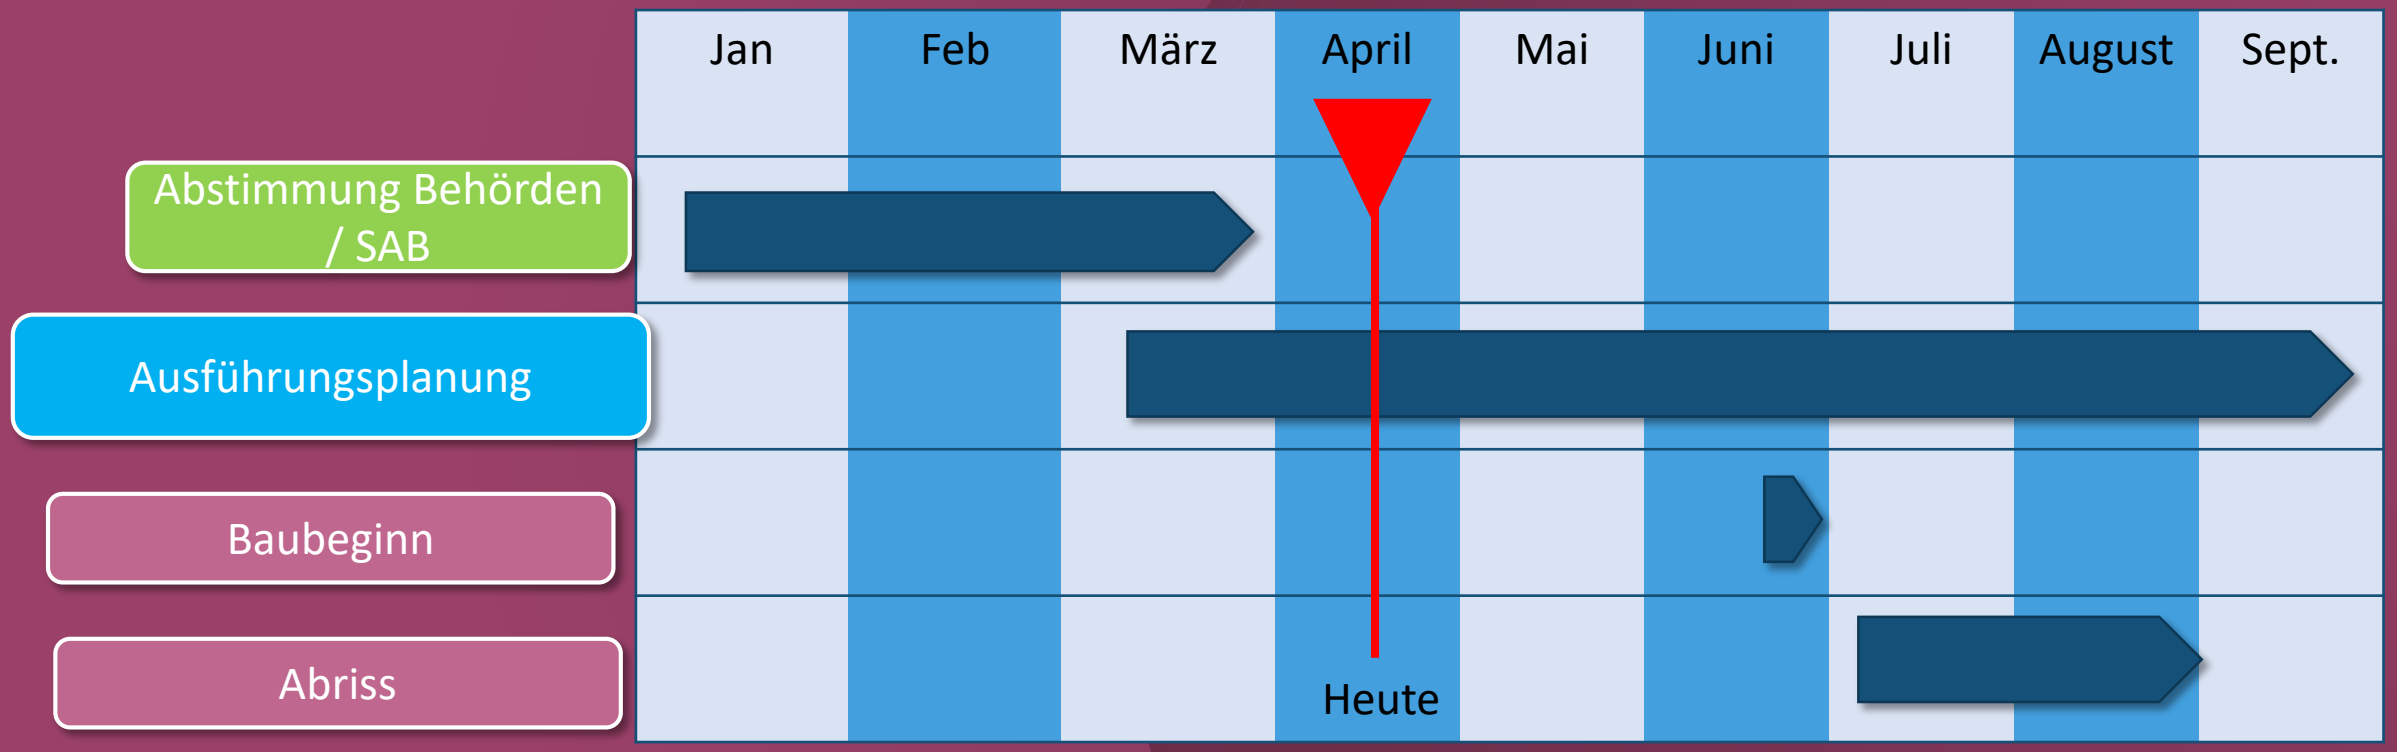

1.5. Sachstand Sanierung Ortsstraßen/ Oder-Neißeradweges

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

PROJEKT SANIERUNG RADWANDERWEG

- **TEILPROJEKT 1 (TEILSTÜCK 1) -> SAGAR /SKERBERSDORF**

  -> ERSATZPFLANZUNG IST ERFOLGT

  -> NACH ERHALT DER SCHLUSSRECHNUNG IST DIESE MAßNAHME ABGESCHLOSSEN

  KEINE KOSTENERHÖHUNG GESAMTBUGET EINGEHALTEN 306T€

  TEILPROJEKT 2 (TEILSTÜCK 2) -> SKERBERSDORF / WERDECK

  -> VERLÄNGERUNGSANTRAG DER FÖ-MITTEL WURDE GENEHMIGT.

  -> BAUBEGINN IST ERFOLGT, WEITERFÜHRUNG WITTERUNGSBEDINGT ABHÄNGIG.

  KEINE KOSTENSTEIGERUNG ERSICHTLICH

  TEILPROJEKT 3 (TEILSTÜCK 3) -> WERDECK / GEMARKUNGSGRENZE

  FÖRDERMITTELANTRAG IST GESTELLT.

Kosten:

1 BA: FÖ-Mittel: 275T€ Eigenmittel:31T€ gesamt: 306T€

2. BA: FÖ-Mittel: 293T€ Eigenmittel:32T€ gesamt: 325T€

ORTSSTRAßEN

PROJEKTE 2023: IN ERSTELLUNG

ABSTIMMUNG IM HAUPTAUSSCHUSS

1.5. Sachstand Sanierung Ortsstraßen/ Oder- Neißeradweges

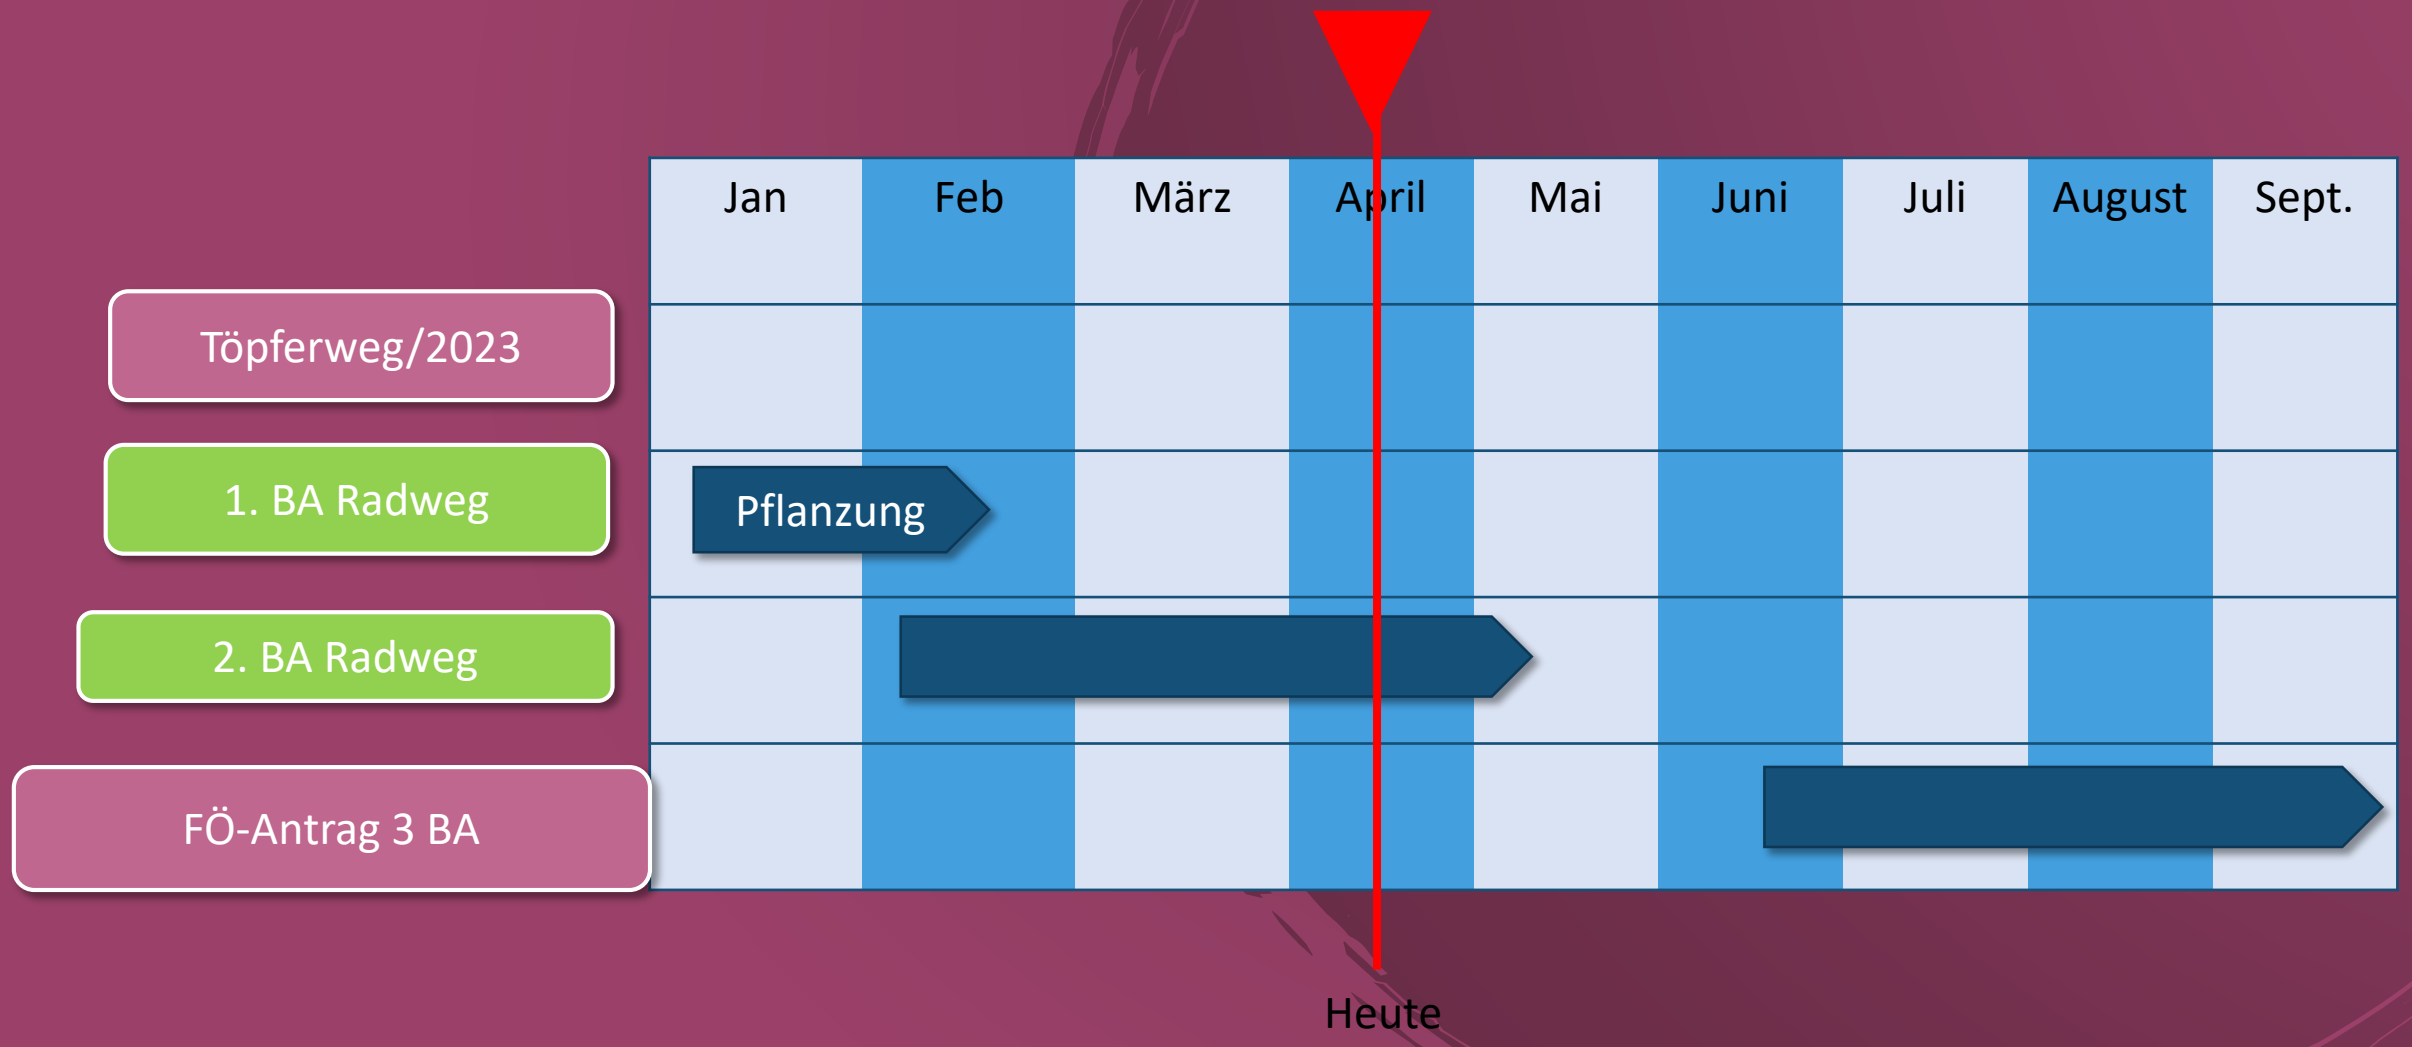

1.6. Sachstand Erlebniswelt Krauschwitz

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

SACHSTAND:

- **INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN DERZEIT IN DER UMSETZUNG**
- **GUTE BIS SEHR GUTE BESUCHERZAHLEN IM 1 QUARTAL**

1.7. Feuerwehr-Gerätehaus Skerbersdorf

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

SACHSTAND:

- ROHBAULOS IN AUSFÜHRUNG
- AUSCHREIBUNG FÜR DAS LOS HLS IST IN DER E-VERGABE
- ELE PLAUNG KURZ VOR ABSCHLUSS

NÄCHSTE SCHRITTE:

- 1. Erstellung LOS Dachdecker und Fenster/Türen (voraussichtlich Anfang 2. Quartal) (04/2023)
- 2. Ausschreibung der Lose für HLS und ELT laufen derzeit an/ Vergabe in der Maisitzung geplant

BAUKOSTEN:

GESAMTKOSTEN: CA. 1 MIO. €

EIGENANTEIL: CA. 600.000 €

1.7. Feuerwehr-Gerätehaus Skerbersdorf

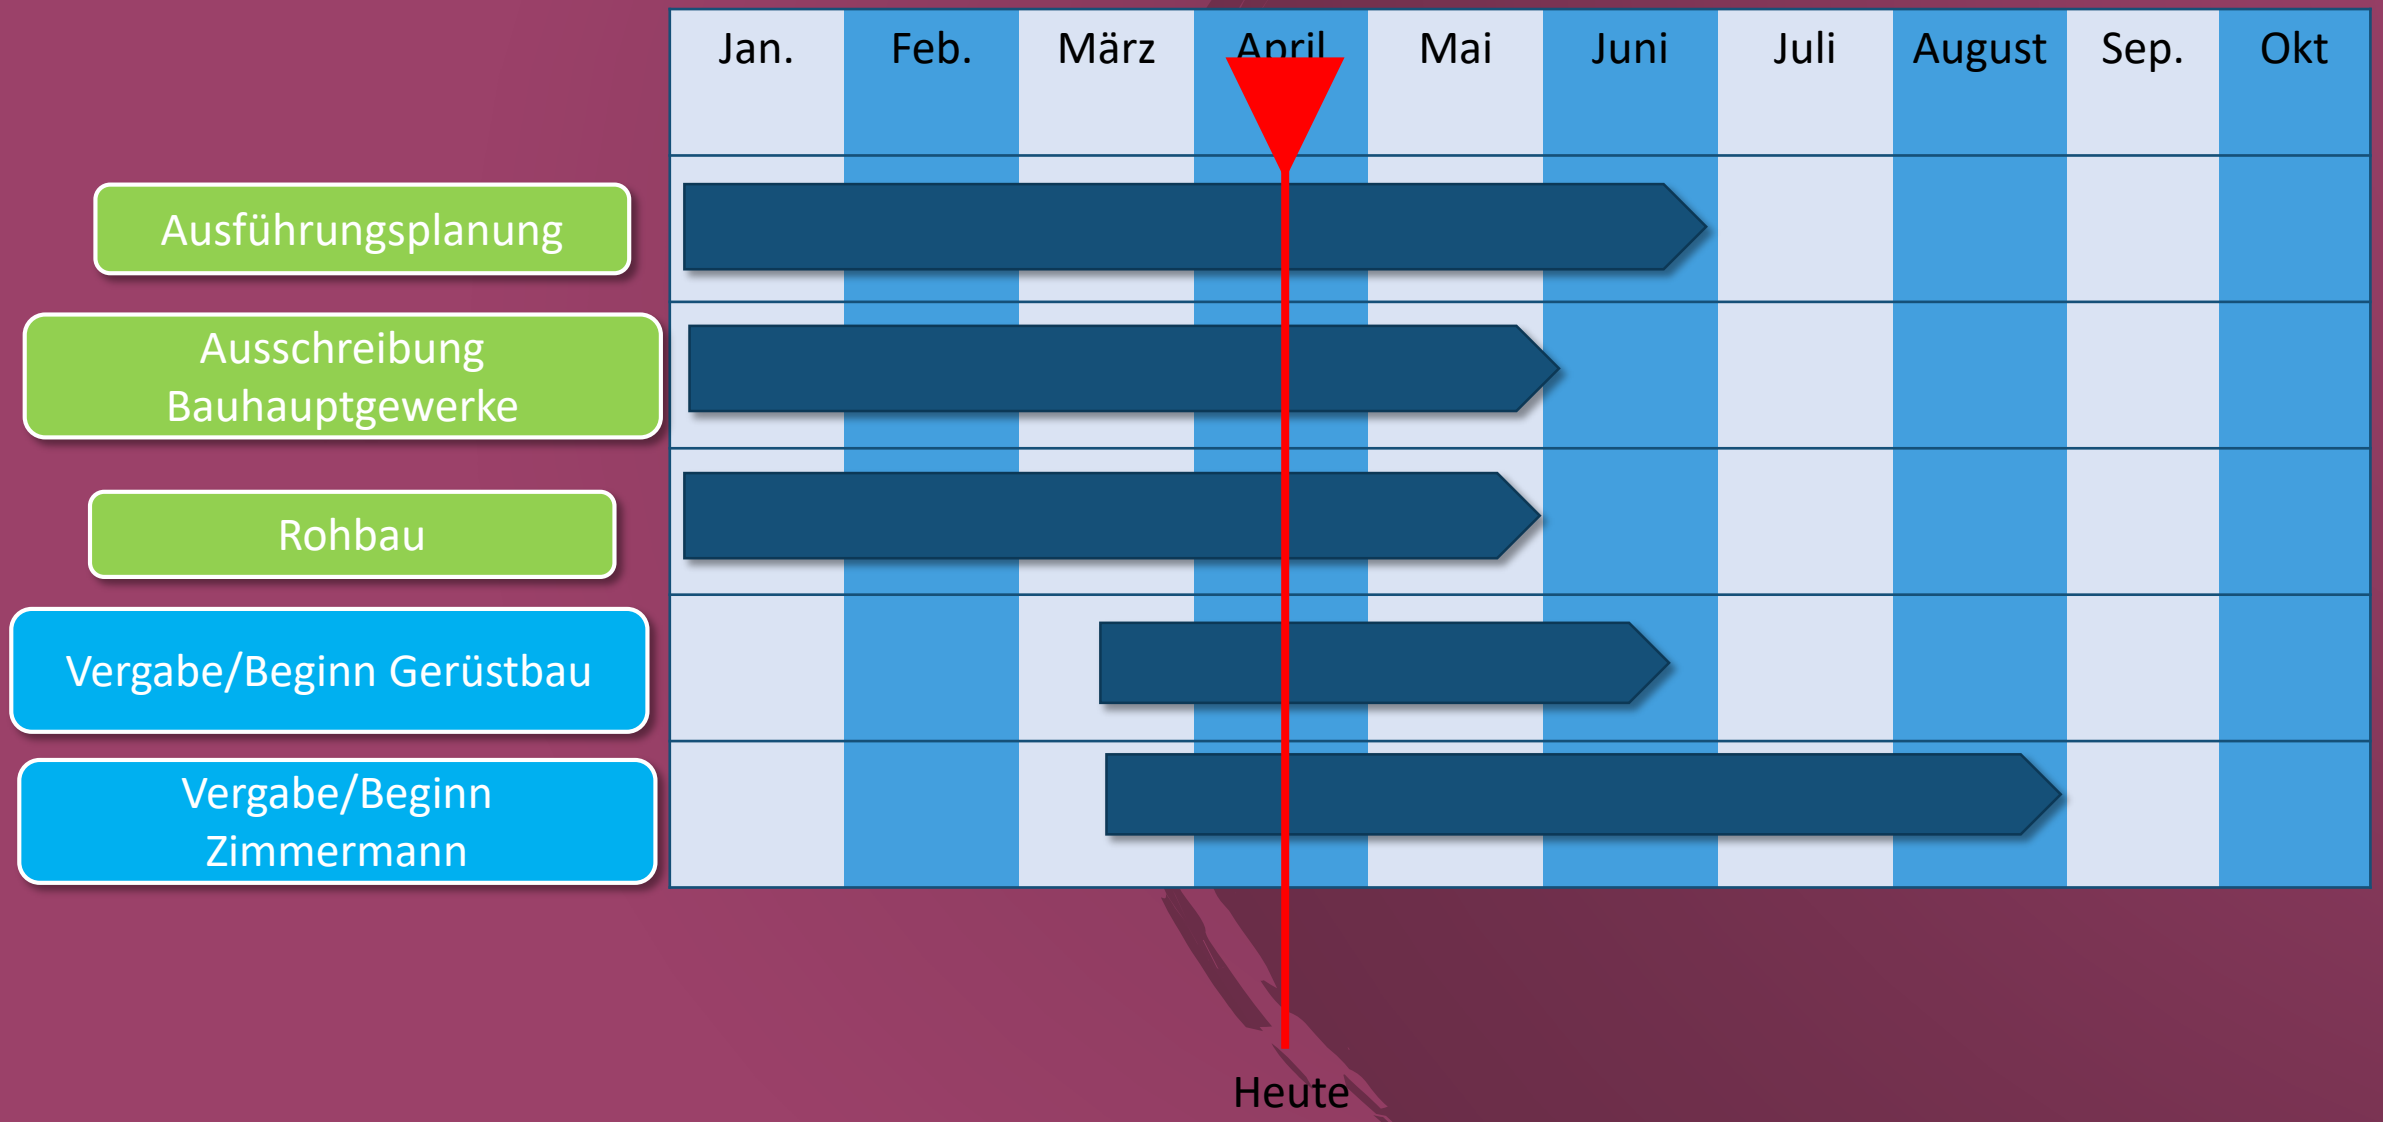

1.8. LED Umstellung

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

SACHSTAND:

-> ZUR ZEIT ERFOLGEN WEITERE PRÜFUNGEN ZU MÖGLICHEN FÖRDERMITTELN

-> NEUBERECHNUNG DER MÖGLICHEN FÖRDERMITTEL SOWIE DES EIGENMITTEL INFORMATIONEN IN DEN VWA

-> VORAUSSICHTLICHER PROJEKTSTART 2023

DETAILS:

GESAMTSUMME: 500 T€

FÖRDERSUMME: 475 T€

EIGENMITTEL: 25 T€

1.9. PV-anlage Sagar

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

SACHSTAND:

BAULEITPLANUNGSVERFAHREN FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG ZUM VORENTWURF WURDE DURCHGEFÜHRT

AUSWERTUNG DER STELLUNGNAHMEN IST ERFOLGT

ABSTIMMUNG MIT NETZBETREIBER ZUM NETZANSCHLUSS WURDE FORTGESETZT

FLÄCHENSICHERUNG FORTGESCHRITTEN; RECHERCHE ZU NICHT AUFFINDBAREN EIGENTÜMERN DURCHGEFÜHRT

ERGÄNZENDES NATURSCHUTZFACHLICHES GUTACHTEN NOTWENDIG DURCHFÜHRUNG IM APRIL/MAI GEPLANT

WEITERE GUTACHTEN (BRANDSCHUTZ, BAUGRUND) GEPLANT

ERARBEITUNG DES ENTWURFS

KONKRETISIERUNG DER TECHNISCHEN DETAILPLANUNG DER PVA

KONKRETISIERUNG DER KABELTRASSE ZUM NETZANSCHLUSSPUNKT

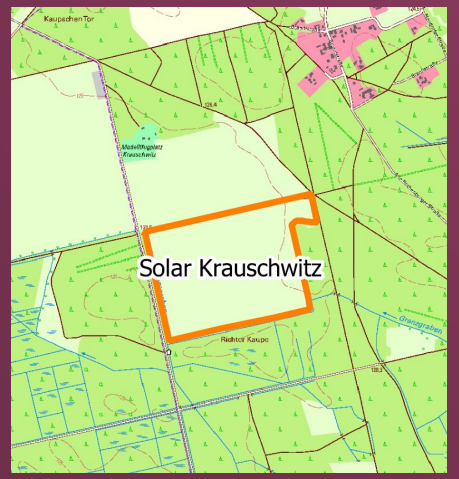

1.9. PV-anlage Sagar

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.

ZEITPLAN:

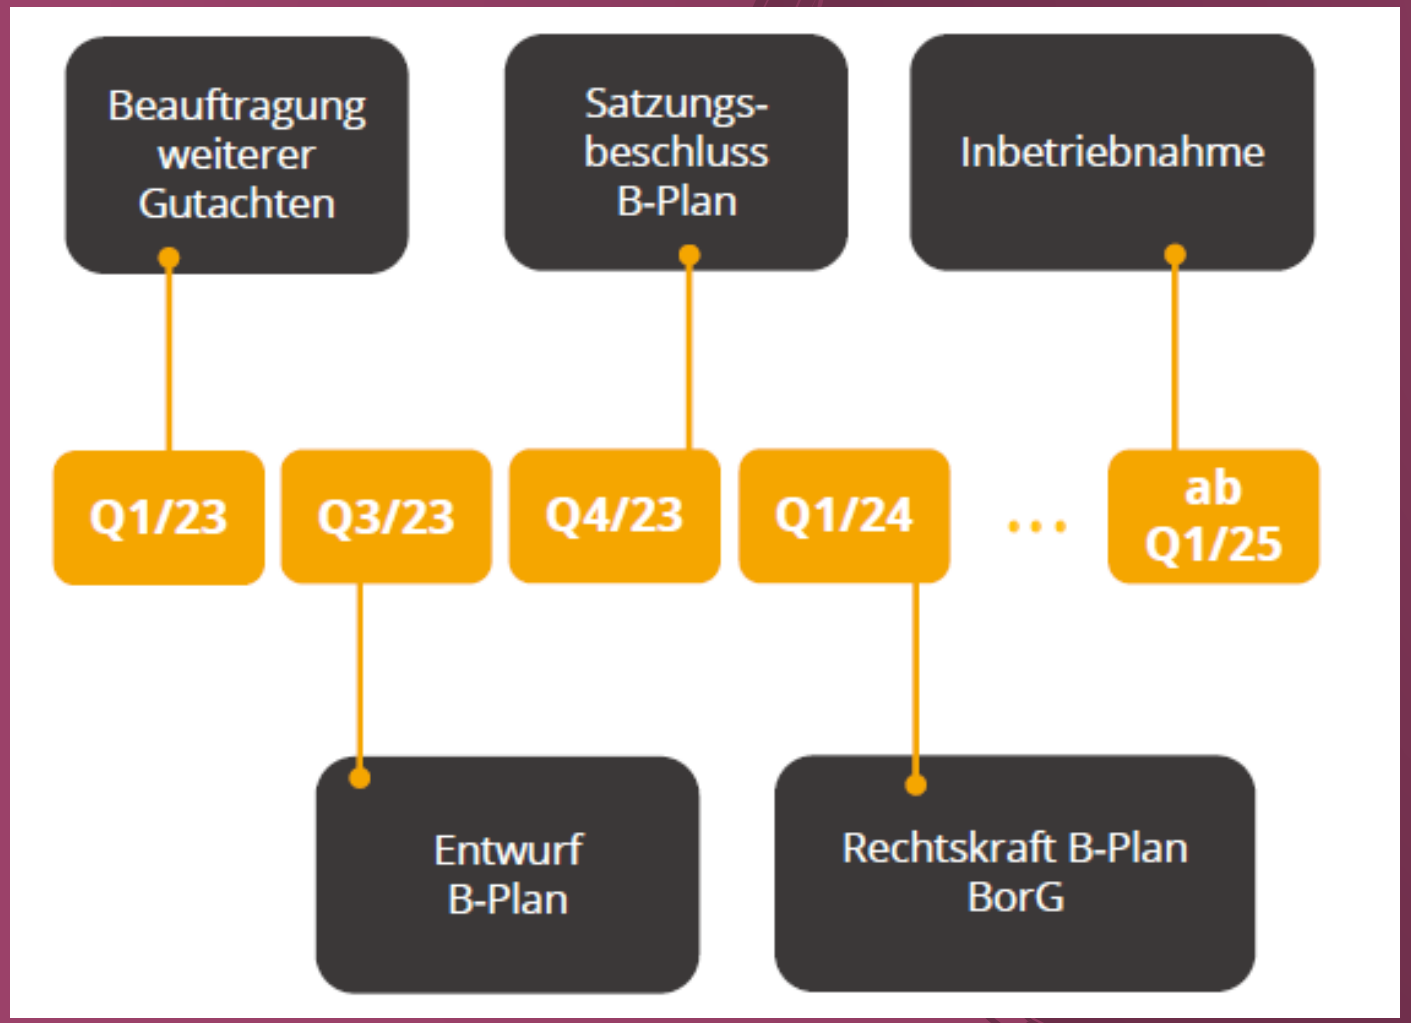

1.10. OU Krauschwitz

Gemeinde
chwitz
O.L.

SACHSTAND:

- DERZEIT ERFOLGT EINE ENTWURFSPLANUNG, WELCHE IM 1. QUARTAL VORGESTELLT WERDEN SOLL.
- TERMINABSTIMMUNG AM 28.02.2023 MIT LASUV
- VORSTELLUNG MAI 2023 / EINLADUNG FOLGT.

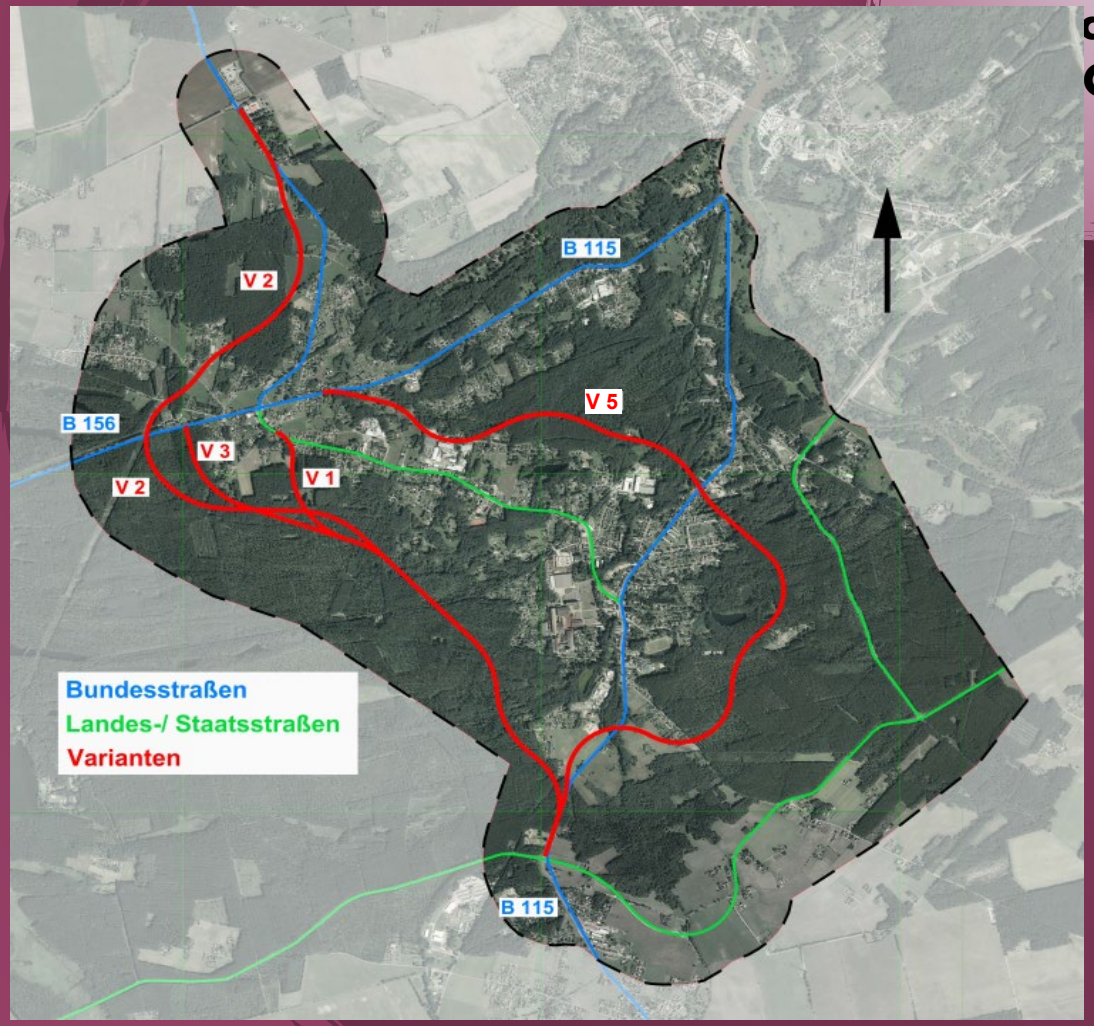

2. TERMINE

ORTSCHAFTSRATSSITZUNG	19.04.2023	BEGINN: 18:00 UHR
FRÜHJAHRSPUTZ HELMUT JUST STADION KRAUSCHWITZ	22.04.2023	BEGINN: 09:00 UHR
HAUPTAUSSCHUSS	08.05.2023	BEGINN: 17:00 UHR
GEMEINDERATSSITZUNG :	23.05.2023	BEGINN: 18:00 UHR

Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden ortsüblich bekanntgegeben

VIELEN DANK

Ihr Bürgermeister
